

Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1 – MAS Region Kunětické hory, z.s.

Vzhledem k tomu, že SCLLD byla schválena řídicími orgány se zpožděním až 7/2016 a vyhlášení prvních výzev muselo být posunuto až na 12/2016 dochází již od počátku realizace SCLLD k výraznému posunu v naplňování finančního a indikátorového plánu.

V roce 2016 byly vyhlášeny 2 výzvy z OPZ na celkovou alokaci 2.115.000,-Kč. V rámci těchto výzev byly přijaty 2 projekty, oba v rámci OPZ/O4. V realizaci byl jediný, druhý projekt neprošel věcným hodnocením. Projekt byl úspěšně celý proplacen, úspěšnost čerpání z těchto výzev z roku 2016 je 21,6 %.

Na posun v naplňování finančního a indikátorového plánu bylo v roce 2017 reagováno vyhlášením většího počtu výzev (celkem v roce 2017 vyhlášeno 9 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2017 u PRV: 4.075.000,00 Kč, u OPZ: 4.692.500,00 Kč, u IROP: 14.565.000,-Kč). V rámci těchto výzev bylo přijato 6 projektů, které jsou nyní zrealizovány a v udržitelnosti, vyjma 1 projektu, kterému byla ukončena v udržitelnosti administrace. Skutečná úspěšnost výzev z roku 2017 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 15,7 % (úspěšnost snížena o projekt, u kterého byla ukončena administrace v udržitelnosti), OPZ, 16 %, IROP: 20,6 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty), PRV/F2 (1 projekt – ukončena administrace v udržitelnosti), OPZ/O4 (1 projekt), IROP/O1 (2 projekty).

V roce 2018 bylo navázáno na trend z roku 2017 a byl vyhlášen větší počet výzev (celkem v roce 2018 vyhlášeno 8 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2018 u PRV: 7.316.000,00 Kč, u OPZ: 4.460.000,00 Kč, u IROP: 24.565.888,83 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 11 projektů, z toho 1 projekt neprošel věcným hodnocením, u 2 projektů byl ukončen administrativní proces na žádost žadatelů, 8 projektů je zrealizováno a v udržitelnosti. Skutečná udržitelnost výzev z roku 2018 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 20,1 %, OPZ: 26,9 %, IROP: 32,95 % (u 2 projektů došlo k úspoře), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (3 projekty), PRV/F4 (2 projekty - vyřazeny), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (1 projekt), OPZ/O3 (1 projekt – vyřazen), IROP/O4 (1 projekt), IROP/O5 (2 projekty). Dále byl v tomto roce realizován projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.

Na začátku roku 2019 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a snížení alokace IROP o 1.913.341,00 Kč z důvodu nuceného přepočtu eura, dále došlo k přesunu alokace mezi opatřeními u OPZ. V roce 2019 bylo vyhlášeno menší množství výzev, protože většina výzev z roku 2018 byla otevřená ještě v roce 2019 (celkem v roce 2019 vyhlášeny 3 výzvy) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2019 u PRV: 5.349.398,00 Kč, u OPZ: 4.400.723,75 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 6 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 5 projektů je nyní zrealizováno a v udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2019 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 23,1 % (skutečná úspěšnost – projekty byly proplaceny), OPZ: 95 % (zatím u 2 projektů došlo k úsporám), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty – 1 vyřazen), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (2 projekty), OPZ/O3 (1 projekt). Dále byl v tomto roce realizován a ukončen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč. V roce 2019 proběhla povinná evaluace realizace SCLLD.

Na začátku roku 2020 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a PRV a přesunu mezi opatřeními/fichemi, dále došlo k úpravě indikátorů u PRV v důsledku evaluace SCLLD a veřejného projednání. V průběhu roku 2020 došlo k přesunu mezi opatřeními ve finančním plánu IROP. V roce 2020 bylo vyhlášeno 5 výzev v podstatě na zbytkové alokace (celkem v roce 2020 u PRV: 8.147.284,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 20.936.057,57 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 12 projektů, z toho 2 projekty nebyly vybrány, 1 projekt je v realizaci a 9 projektů v udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2020 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 21,4 % (skutečná úspěšnost je 21,4 %, protože jeden projekt dostal sankci, u jednoho



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

projektu došlo k úsporám), IROP: 67,4 % (zatím u 1 projektu došlo k úsporám), přičemž největší zájem byl zatím o PRV/F1 (1 projekty + 2 projekty nebyly vybrány), PRV/F10 (3 projekty), IROP/O1 (4 projekty), IROP/O2 (1 projekt), IROP/O3 (1 projekt). Dále byl v tomto roce proplacen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.

Na začátku roku 2021 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a přesunu mezi opatřeními. V roce 2021 byly vyhlášeny 4 výzvy v podstatě na zbytkové alokace (celkem v roce 2021 u PRV: 6.402.689,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 4.453.340,63 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 13 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 1 projekt nebyl vybrán/odstoupil, 2 projekty odstoupily, 1 projekt je v realizaci, 8 projektů je v udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2021 z hlediska čerpání následující – PRV: 30,2 % (ukončen 1 projekt), IROP: 52,67 % (skutečná úspěšnost – projekty byly zrealizovány), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty), PRV/F2 (2 projekty), PRV/F10 (2 projekty), PRV/F4 (1 projekt – ukončena administrace), PRV/F6 (1 projekt - odstoupil), IROP/O1 (4 projekty – 1 projekt nevybrán/odstoupil, 1 projekt odstoupil) a IROP/O5 (1 projekt).

Na začátku roku 2022 nedošlo k rovnání finančního plánu u IROP a přesunu mezi opatřeními, tato povinnost byla zrušena kvůli dočerpávání alokací. Došlo k rozšíření území o obec Vysoká nad Labem. V roce 2022 byla vyhlášena 1 výzva v podstatě na zbytkovou alokaci (celkem v roce 2022 u PRV: 4.325.894,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášené výzvy bylo přijato 10 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 8 projektů je v realizaci, 1 projekt má podanou ŽoPI. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2022 z hlediska čerpání následující – PRV: 83,6 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (4 projekty), PRV/F10 (3 projekty), PRV/F2 (1 projekty), PRV/F6 (1 projekt).

2

Na začátku roku 2023 nedošlo k rovnání finančního plánu u IROP a přesunu mezi opatřeními, tato povinnost byla zrušena kvůli dočerpávání alokací. Bude obdržena alokace pro přechodné období v PRV ve výši 3 269 100 Kč po podání žádosti o změnu SCLLD. V roce 2023 byla vyhlášena 1 výzva na zbytkovou alokaci (celkem v roce 2023 u PRV: 873 827,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášené výzvy byly přijaty 3 projekty, u projektů stále probíhá administrativní kontrola na MAS. K tomuto datu není možné z důvodu neukončeného hodnocení vyhodnotit úspěšnost vyhlášené výzvy z roku 2023, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty), PRV/F10 (1 projekt). V rámci PO 2021-2027 je v realizaci projekt Komunita pro komunitu z OPZ+, byla proplacena záloha, 1. etapa projektu končí až 31.7.2023, proto nelze plnění projektu vyhodnotit.


Celkové dosavadní čerpání alokovaných peněžních prostředků k 25.5.2023 je následující (projekty jsou očištěné o nerealizované finanční prostředky, nejsou zahrnuty projekty, u kterých nebylo dokončeno hodnocení na MAS):



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

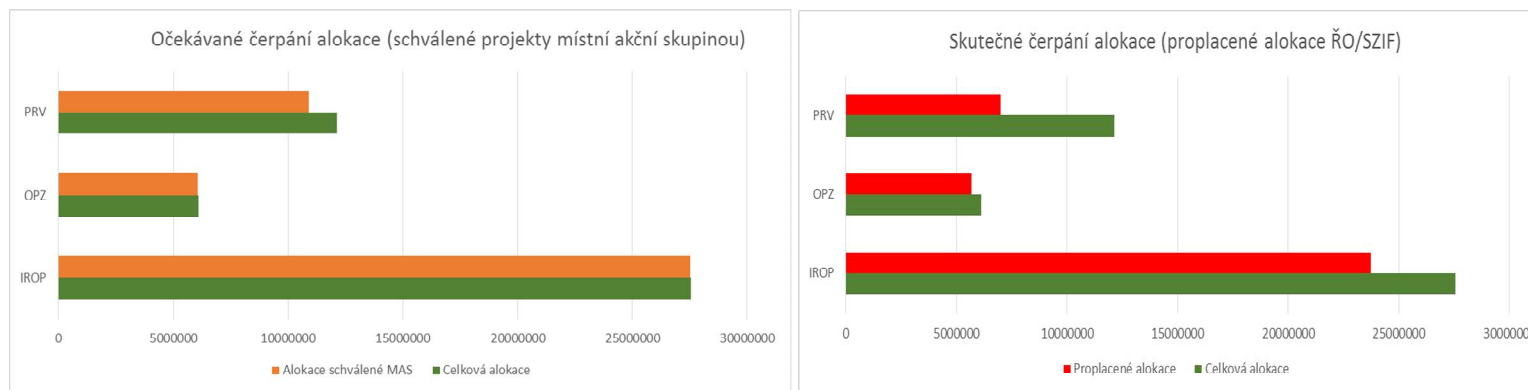

Z uvedeného vyplývá, že alokace z OPZ a IROP je téměř všechna závazková. Není závazkováno 100 % z důvodů nedočerpání posledních výzev, krácení na projektech, úsporám na projektech. Čerpání je nyní plně na žadatelích, MAS již nemá právo do čerpání zasahovat. U PRV byla v roce 2023 vyhlášena výzva, projekty jsou teprve v hodnocení, proto není možné stanovit aktuálnější očekávané čerpání alokace u PRV, dále bude možné ještě letos vyhlásit další výzvu po schválení ŽoZ SCLLD k obdržení alokace pro přechodné období, touto alokací dojde k navýšení stávající alokace o 3 269 100 Kč.

3

K naplňování indikátorového plánu dochází po proplacení projektů (PRV), nebo dle data ukončení realizace (MMR) a to vždy do 31.10. daného roku (u milníků do 31.12.2018). Takové projekty jsou evidovány u PRV – 17 projektů k datumu 25.5.2023, dá se předpokládat 22 projektů k 31.10.2023 a u IROP – 13 projektů k datumu 25.5.2023, dá se předpokládat 14 projektů k 31.10.2023. U OPZ – 6 projektů k datumu 25.5.2023. Naplňování indikátorového plánu nelze urychlit, protože závisí především na době a délce realizace projektů žadatelů/příjemců (u každého projektu individuální), ale i na délce kontroly projektů. Jelikož dochází ke zpoždění finančního plánu, dochází ke zpoždování i indikátorového plánu. Indikátorový plán nebude naplněn v celé výši, jednak kvůli tomu, že musely být zvýšeny alokace na projekty (kvůli zajištění plnění finančního plánu, kvůli vývoji tržních cen) a jednak kvůli nízkému zájmu o některá opatření/fiche a tedy přesunu finančních prostředků mezi opatřeními/fichemi. V rámci povinné evaluace byly narovnaný indikátory u PRV, další narovnání u PRV je plánováno v souvislosti s navýšením alokace o alokaci pro přechodné období. Na doporučení MMR a MPSV narovnání indikátorů zatím u IROP a OPZ neproběhlo, ale bylo předběžně projednáno, že by narovnání v odůvodněných případech mělo být umožněno. Z toho důvodu při plnění indikátorového plánu dochází k největším potížím u indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader), kde má dojít k vytvoření 2 pracovních míst, dosud žadatelé nevytvořily žádné pracovní místo, a pokud MAS neobdrží alokaci pro přechodné období, tak ani nevytvoří. MAS naplnění tohoto indikátoru podporuje preferenčním kritériem (v roce 2021 došlo k zvýšení stupně zvýhodnění) a animací území, k vytvoření pracovního místa ale žadatele nutit nemůže. I kdyby mohla tak u malých projektů, příp. druhu projektů, které byly dosud podpořeny, to není ani vhodné (neúměrný či nesplnitelný závazek pro žadatele). Zpřísnění preferenčních kritérií by zase vedlo k neplnění finančního plánu. K. Holečková projednávala v minulých letech situaci se zástupkyní MZe (L. Chlupáčová), MZe ale v té době nevědělo, jak se k neplnění indikátoru postaví a dosud nebyly podány žádné nové informace. Bylo dáno pouze doporučení zaměřit se na potenciální žadatele mezi začínajícími podnikateli (podnikatel nově zapsaný do rejstříku se bere jako nově vytvořené pracovní místo), o což se kancelář MAS od té doby snaží. Dále kancelář MAS konzultovala větší projekt, který uvažoval o



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vytvoření 1-2 pracovních míst, žadatel však žádost v roce 2021 nepodal, ani neuvedl důvod, proč tak neučinil. Další projekt byl konzultován v roce 2023 na vytvoření pracovního místa na částečný úvazek, projekt nebyl podán, ale je reálné jeho podání v další výzvě.

Nejčastější problémy, s kterými se realizace SCLLD potýká:

- zpoždění ve schvalování SCLLD řídicími orgány,
- aktualizace metodik a vzorů řídicími orgány,
- u OPZ a IROP se plnění finančního plánu vykazuje až při čerpání finančních prostředků žadatelem (MAS nemá výraznou šanci ovlivnit),
- indikátory integrovaných projektů se budou vykazovat až po ukončení realizace projektu, příp. po jeho proplacení (MAS nemá výraznou šanci ovlivnit),
- náročná a zdlouhavá administrativa při vyhlášení výzev a kontrole žádostí,
- nižší zájem o výzvy MAS (nyní již výrazně lepší, sledován rostoucí počet žadatelů),
- navzdory motivace žadatelů, žádost podá menší část konzultovaných projektů (nejčastější důvody dle K. Holečkové: nezpůsobilost výdajů či žadatele, žadatel neodhadne dobu přípravy žádosti, problémy s předfinancováním, žadatel se „zalekne“ administrativy, plány překazil COVID-19, problémy s nedostatkem materiálu a růstem cen, hospodářská krize),
- prodlužování projektů žadatelů především kvůli obtížnější realizaci z důvodu COVID-19 a nedostatkem dodavatelů pro výběrová řízení (MAS nemá výraznou šanci ovlivnit).

4

V následující tabulce předkládáme předpokládané plnění indikátorů na tento rok, který vychází ze změny SCLLD v důsledku povinné evaluace a aktuálního plánovaného harmonogramu výzev (tzn. dle toho jaké výzvy jsou v plánu v roce 2023 vyhlášovat) a konzultací s potenciálními žadateli kanceláří MAS. Plán se zaměřuje na indikátory výstupu, které se MAS zavázala naplnit a indikátor výsledku 94800. Vzhledem k tomu, že jsou/byly vyhlášeny poslední výzvy, plnění indikátorového plánu závisí na čerpání projektů. Výraznější změna nastane po obdržení alokace pro přechodné období z PRV. Jakmile to bude umožněno, doporučujeme narovnat indikátorový plán dle skutečnosti.

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů						
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)	Očekávaná dosažená hodnota k 31.10.2023	Očekávané závazkování v roce 2023
SC 1.1	IROP/O1	IROP	4	9d	4.1	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.1.2014	6	31.12.2023	x	0	0
						75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	8	8



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

					75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	x	-	-
					76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7,0	31.12.2011	10,0	31.12.2023	x	-	-
IROP/O2	IROP	4	9d	4.1	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	objekty	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	1	1	1
					57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	sety	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	0	0
					57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	výsledek	108	31.12.2014	48	31.12.2023	x	-	-
IROP/O3	IROP	4	9d	4.1	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	1.1.2014	6	31.12.2023	2	0	0
					55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zařízení	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2023	x	1	1
					55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	1.1.2014	2	31.12.2023	x	0	0
					55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	klienti	výsledek	142	20.5.2016	151	31.12.2023	x	-	-
					55320	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	113,6	20.5.2016	120,8	31.12.2023	x	-	-
					67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	27	20.5.2016	43	31.12.2023	x	-	-
OPZ/O2	OPZ	2	2.3	2.3.1	67001	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	22.12.2015	4	31.12.2023	x	0	0
					60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.6.2016	14	31.12.2023	x	0	0
					67315	Bývalý účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.6.2016	9	31.12.2023	x	-	-



						67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.6.2016	9	31.12.2023	x	-	-
						67010	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	22.12.2015	9	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O4	OPZ	2	2.3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	15	31.12.2023	x	161	161
						50001	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.6.2016	10	31.12.2023	x	74	74
						62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	1	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu hledání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	1	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
SC 1.3	PRV/F9	PRV	6	6B	19.3.1	92501	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	1.1.2014	11313,22	31.12.2022	x	11313,22	11313,22
SC 2.1	PRV/F1	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	8	31.12.2022	2	12	15
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0
	PRV/F2	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2022	1	1	3
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	1	31.12.2022	0	0	0
	PRV/F3	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0
						94302	Celková délka lesních cest	km	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0



	PRV/F4	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2022	0	0	0	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F5	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F7	PRV	6	6B	19.2.1	93102	Počet podpořených kooperačních činností	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F8	PRV	6	6B	19.2.1	93102	Počet podpořených kooperačních činností	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	SC 2.2	PRV/F6	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	počet	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2022	0	2	3
							93001	Celková plocha	ha	výstup	0	1.1.2014	22,2	31.12.2022	0	21,8	139,40
SC 2.3	IROP/O4	IROP	4	9d	4.1	10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	1	1	1	
						10102	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	1	1	
						10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	1.1.2014	6,75	31.12.2023	x	2,2	2,2	
						10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstup	0	1.1.2014	2	31.12.2023	x	0	0	
						10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	1.1.2014	4909,09	31.12.2023	x	171856,03	171856,03	



						10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	výstup	0	1.1.2014	2,03	31.12.2023	x	1,2	1,2
						10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	výsledek	28,5	31.12.2012	22	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O1	OPZ	2	2.3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	20	31.12.2023	x	20	20
						50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	osoby	výsledek	0	1.6.2016	5	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	2	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	5	31.12.2023	x	-	-
						63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	3	31.12.2023	x	-	-
						63100	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O3	OPZ	2	2.3	2.3.1	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	výstup	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	1	1
						60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	4	31.12.2023	x	3	3
						10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	organizace	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-
						62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	4	31.12.2023	x	-	-



						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	4	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	3	31.12.2023	x	-	-
SC 3.1	IROP/O5	IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	1.1.2014	13	31.12.2023	4	3	3
						50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.1.2014	150	31.12.2023	x	180	180
						50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	31.12.2013	5,0	31.12.2023	x	-	-
						50020	Podíl třiletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	x	-	-
	PRV/F10	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	počet	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2022	x	6	9
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	1	31.12.2022	x	0	0

