

## Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1 – MAS Region Kunětické hory, z.s.

### SCLLD 14-20

Vzhledem k tomu, že SCLLD byla schválena řídicími orgány se zpožděním až 7/2016 a vyhlášení prvních výzev muselo být posunuto až na 12/2016 docházelo již od počátku realizace SCLLD k výraznému posunu v naplňování finančního a indikátorového plánu.

V roce 2016 byly vyhlášeny 2 výzvy z OPZ na celkovou alokaci 2.115.000,-Kč. V rámci těchto výzev byly přijaty 2 projekty, oba v rámci OPZ/O4. V realizaci byl jediný, druhý projekt neprošel věcným hodnocením. Projekt byl úspěšně celý proplacen, úspěšnost čerpání z těchto výzev z roku 2016 je 21,6 %.

Na posun v naplňování finančního a indikátorového plánu bylo v roce 2017 reagováno vyhlášením většího počtu výzev (celkem v roce 2017 vyhlášeno 9 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2017 u PRV: 4.075.000,00 Kč, u OPZ: 4.692.500,00 Kč, u IROP: 14.565.000,-Kč). V rámci těchto výzev bylo přijato 6 projektů, které jsou nyní zrealizovány a v udržitelnosti, vyjma 1 projektu, kterému byla ukončena v udržitelnosti administrace. Skutečná úspěšnost výzev z roku 2017 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 15,7 % (úspěšnost snížena o projekt, u kterého byla ukončena administrace v udržitelnosti), OPZ, 16 %, IROP: 20,6 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty), PRV/F2 (1 projekt – ukončena administrace v udržitelnosti), OPZ/O4 (1 projekt), IROP/O1 (2 projekty).

V roce 2018 bylo navázáno na trend z roku 2017 a byl vyhlášen větší počet výzev (celkem v roce 2018 vyhlášeno 8 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2018 u PRV: 7.316.000,00 Kč, u OPZ: 4.460.000,00 Kč, u IROP: 24.565.888,83 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 11 projektů, z toho 1 projekt neprošel věcným hodnocením, u 2 projektů byl ukončen administrativní proces na žádost žadatelů, 8 projektů je zrealizováno a v udržitelnosti. Skutečná úspěšnost výzev z roku 2018 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 20,1 %, OPZ: 26,9 %, IROP: 32,95 % (u 2 projektů došlo k úspoře), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (3 projekty), PRV/F4 (2 projekty - vyřazen), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (1 projekt), OPZ/O3 (1 projekt – vyřazen), IROP/O4 (1 projekt), IROP/O5 (2 projekty). Dále byl v tomto roce realizován projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.

Na začátku roku 2019 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a snížení alokace IROP o 1.913.341,00 Kč z důvodu nuceného přepočtu eura, dále došlo k přesunu alokace mezi opatřeními u OPZ. V roce 2019 bylo vyhlášeno menší množství výzev, protože většina výzev z roku 2018 byla otevřená ještě v roce 2019 (celkem v roce 2019 vyhlášeny 3 výzvy) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2019 u PRV: 5.349.398,00 Kč, u OPZ: 4.400.723,75 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 6 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 5 projektů je nyní zrealizováno a v udržitelnosti. Skutečná úspěšnost výzev z roku 2019 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 23,1 %, OPZ: 83,8 % (došlo ke krácení a úsporám na projektech), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty – 1 vyřazen), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (2 projekty), OPZ/O3 (1 projekt). Dále byl v tomto roce realizován a ukončen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč. V roce 2019 proběhla povinná evaluace realizace SCLLD.

Na začátku roku 2020 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a PRV a přesunu mezi opatřeními/fichemi, dále došlo k úpravě indikátorů u PRV v důsledku evaluace SCLLD a veřejného projednání. V průběhu roku 2020 došlo k přesunu mezi opatřeními ve finančním plánu IROP. V roce 2020 bylo vyhlášeno 5 výzev v podstatě na zbytkové alokace (celkem v roce 2020 u PRV: 8.147.284,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 20.936.057,57 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 12 projektů, z toho



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2 projekty nebyly vybrány a 10 projektů je v udržitelnosti. Skutečná úspěšnost výzev z roku 2020 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 21,14 % (1 projekt dostal sankci, u 1 projektu došlo k úsporám), IROP: 67,4 % (u 1 projektu došlo k úsporám), přičemž největší zájem byl zatím o PRV/F1 (1 projekty + 2 projekty nebyly vybrány), PRV/F10 (3 projekty), IROP/O1 (4 projekty), IROP/O2 (1 projekt), IROP/O3 (1 projekt). Dále byl v tomto roce proplacen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.

Na začátku roku 2021 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a přesunu mezi opatřeními. V roce 2021 byly vyhlášeny 4 výzvy v podstatě na zbytkové alokace (celkem v roce 2021 u PRV: 6.402.689,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 4.453.340,63 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 13 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 1 projekt nebyl vybrán/odstoupil, 2 projekty odstoupily a 9 projektů je v udržitelnosti. Skutečná úspěšnost výzev z roku 2021 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 30,3 % (ukončen 1 projekt), IROP: 52,67 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty), PRV/F2 (2 projekty), PRV/F10 (2 projekty), PRV/F4 (1 projekt – ukončena administrace), PRV/F6 (1 projekt - odstoupil), IROP/O1 (4 projekty – 1 projekt nevybrán/odstoupil, 1 projekt odstoupil) a IROP/O5 (1 projekt).

Na začátku roku 2022 nedošlo k rovnání finančního plánu u IROP a přesunu mezi opatřeními, tato povinnost byla zrušena kvůli dočerpávání alokací. Došlo k rozšíření území o obec Vysoká nad Labem. V roce 2022 byla vyhlášena 1 výzva v podstatě na zbytkovou alokaci (celkem v roce 2022 u PRV: 4.325.894,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášené výzvy bylo přijato 10 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 1 projekt je v realizaci, 8 projektů je v udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2022 z hlediska čerpání následující – PRV: 77 % (zatím u 2 projektů došlo k úsporám), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (4 projekty), PRV/F10 (3 projekty), PRV/F2 (1 projekt), PRV/F6 (1 projekt).

2

Na začátku roku 2023 nedošlo k rovnání finančního plánu u IROP a přesunu mezi opatřeními, tato povinnost byla zrušena kvůli dočerpávání alokací. Byla obdržena alokace pro přechodné období v PRV ve výši 3 269 100 Kč po podání žádosti o změnu SCLLD, finanční plán u PRV byl rovnán v rámci této změny. V roce 2023 byly vyhlášeny 1 výzva na zbytkovou alokaci a 1 výzva na alokaci pro přechodné období (celkem v roce 2023 u PRV: 4.093.988,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 10 projektů, z toho 2 projekty jsou v realizaci, 1 projekt má podanou ŽoPI, 2 projekty nebyly vybrány kvůli nedostatku finančních prostředků a u 5 projektů probíhá administrativní kontrola na RO SZIF. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost výzev z roku 2023 z hlediska čerpání následující – PRV: 103,4 % (bylo umožněno přečerpání, zatím u 1 projektu došlo k úspoře), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (4 projekty – 1 nebyl vybrán), PRV/F2 (1 projekt), PRV/F10 (5 projektů – 1 nebyl vybrán).

Na začátku roku 2024 nedošlo k rovnání finančního plánu a přesunu mezi opatřeními, tato povinnost byla zrušena. V roce 2024 nebyla vyhlášena žádná výzva.


Celkové dosavadní čerpání alokovaných peněžních prostředků k 7.6.2024 je následující (projekty jsou očištěné o nerealizované finanční prostředky):



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

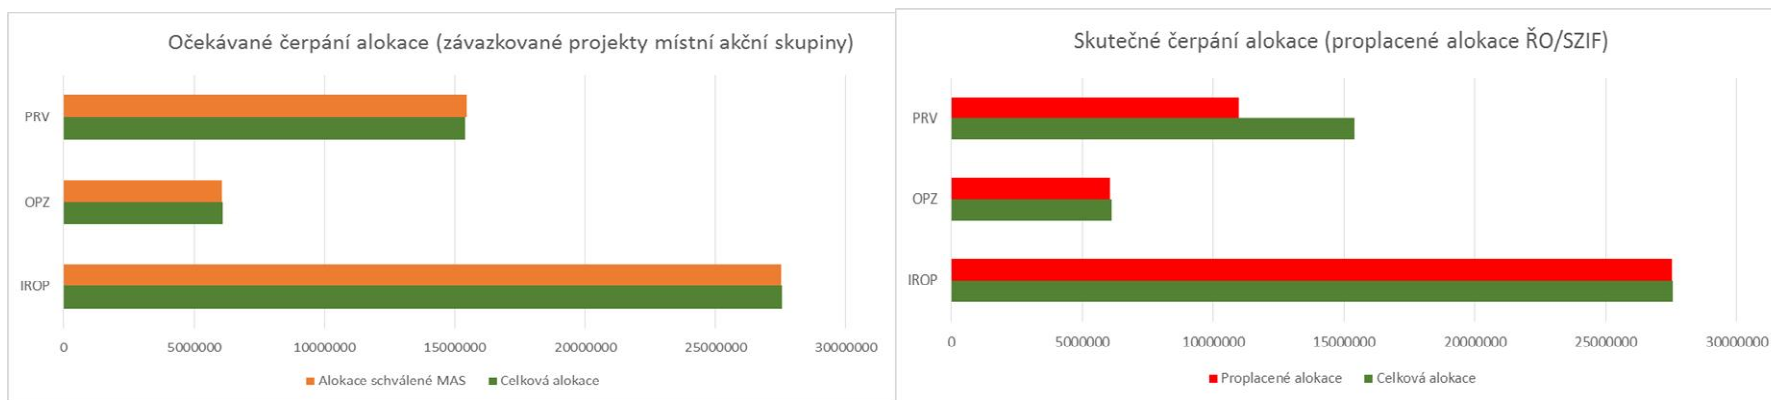

Z uvedeného vyplývá, že alokace z OPZ a IROP je téměř všechna závazková. Není závazková 100 % z důvodů nedočerpání posledních výzev, krácení na projektech, úsporám na projektech. U PRV je alokace závazková mírně nad 100 %, pokud připočítáme i alokaci projektu, kterému byla ukončena administrace v udržitelnosti, takže tuto alokaci již nešlo více využít. Závazování nad 100 % bylo umožněno ve výzvě MAS č. 9 z PRV.

K naplňování indikátorového plánu dochází po proplacení projektů (PRV), nebo dle data ukončení realizace (MMR) a to vždy do 31.10. daného roku (u milníků do 31.12.2018). Takové projekty jsou evidovány u PRV – 26 projektů k datumu 7.6.2024, dá se předpokládat 27 projektů k 31.10.2024, u IROP – 14 projektů a u OPZ – 6 projektů. Naplňování indikátorového plánu nelze urychlit, protože závisí především na době a délce realizace projektů žadatelů/příjemců (u každého projektu individuální), ale i na délce kontroly projektů. Nyní již indikátorový plán nelze vůbec ovlivnit. V indikátorovém plánu jsou evidována plnění nad 100 % i pod 100 % včetně nulových hodnot. Indikátorový plán nebude naplněn v celé výši, jednak kvůli tomu, že musely být zvýšeny alokace na projekty (kvůli zajištění plnění finančního plánu, kvůli vývoji tržních cen) a jednak kvůli nízkému zájmu o některá opatření/fiche a tedy přesunu finančních prostředků mezi opatřeními/fichemi. V rámci povinné evaluace byly narovnané indikátory u PRV, dále byly narovnané indikátory u PRV v souvislosti s navýšením alokace o alokaci pro přechodné období, nicméně již není narovnání aktuální. Na doporučení ŘO narovnání indikátorů zatím u IROP a OPZ vůbec neproběhlo a zatím to není požadováno, pokud by se situace změnila za neplnění indikátorového plánu by hrozily sankce či postihy, doporučujeme indikátorový plán narovnat dle skutečnosti. U indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader), kde má dojít k vytvoření 2 pracovních míst, se jeden projekt zavázal k vytvoření 0,5 pracovního místa. MAS naplnění tohoto indikátoru podporovala preferenčním kritériem (v roce 2021 došlo k zvýšení stupně zvýhodnění) a animací území, k vytvoření pracovního místa ale žadatele nutit nemůže. I kdyby mohla tak u malých projektů, příp. druhu projektů, které byly dosud podpořeny, to není ani vhodné (neúměrný či nesplnitelný závazek pro žadatele). Zpřísnění preferenčních kritérií by zase vedlo k neplnění finančního plánu. K. Holečková projednávala v minulých letech situaci se zástupkyní MZe (L. Chlupáčová), MZe ale v té době nevědělo, jak se k neplnění indikátoru postaví a dosud nebyly podány žádné oficiální informace. Bylo dáno pouze doporučení zaměřit se na potenciální žadatele mezi začínajícími podnikateli (podnikatel nově zapsaný do rejstříku se bere jako nově vytvořené pracovní místo), o



což se kancelář MAS od té doby snažila. Dále kancelář MAS konzultovala větší projekt, který uvažoval o vytvoření 1-2 pracovních míst, žadatel však žádost v roce 2021 nepodal, ani neuvedl důvod, proč tak neučinil. Dle současných neoficiálních vyjádření ŘO by nenaplnění tohoto indikátoru nemělo působit potíže.

Nejčastější problémy, s kterými se realizace SCLLD potýkala:

- zpoždění ve schvalování SCLLD řídicími orgány,
- aktualizace metodik a vzorů řídicími orgány,
- u OPZ a IROP se plnění finančního plánu vykazuje až při čerpání finančních prostředků žadatelem (MAS neměla výraznou šanci ovlivnit),
- indikátory integrovaných projektů se budou vykazovat až po ukončení realizace projektu, příp. po jeho proplacení (MAS neměla výraznou šanci ovlivnit),
- náročná a zdouhavá administrativa při vyhlášení výzev a kontrole žádostí,
- nižší zájem o výzvy MAS (postupně se počet žadatelů navyšoval),
- navzdory motivaci žadatelů, žádost podala menší část konzultovaných projektů (nejčastější důvody dle K. Holečkové: nezpůsobilost výdajů či žadatele, žadatel neodhadne dobu přípravy žádosti, problémy s předfinancováním, žadatel se „zalekne“ administrativy, plány překazil COVID-19, problémy s nedostatkem materiálu a růstem cen, hospodářská krize),
- prodlužování projektů žadatelů především kvůli obtížnější realizaci z důvodu COVID-19 a nedostatkem dodavatelů pro výběrová řízení (MAS neměla výraznou šanci ovlivnit).

4

Sledované interní indikátory + **povinně sledované indikátory**:

Program	Kód	Název ukazatele	MJ	Výchozí stav	Požadovaný stav	Skutečný stav (rok 5/2024)
IROP	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	klienti	142	151	0
IROP	55320	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	113,6	120,8	0
IROP	67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	27	43	20



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

IROP	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	108	48	107
IROP	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	7	10	není sledován, realizace SCLLD neměla vliv
IROP	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	30	35	31
OPZ	67010	Využívání podpořených služeb	osoby	0	9	0
OPZ	67315	Bývalý účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	0	9	0
OPZ	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	0	9	0
OPZ	62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	0	2	0
OPZ	62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	0	1	0
OPZ	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu hledání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	0	1	0
OPZ	62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	0	2	0



IROP	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	0	6	0
IROP	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	0	6	0
IROP	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zařízení	0	4	4
IROP	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	0	2	0
IROP	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám ISZ	objekty	0	3	1
IROP	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek ISZ	sety	0	3	0
IROP	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	0	3	8
OPZ	60000	Celkový počet účastníků	osoby	0	29	165
OPZ	67001	Kapacita podpořených služeb	místa	0	4	0
OPZ	50001	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	0	10	77
NČI	220100	Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady	počet	0	2	0



NČI	633105	Počet podpořených kulturních akcí	počet	0	5	5
NČI	651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2	0	10	62
IROP	82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	0	57	57
PRV	92501	Celkové veřejné výdaje	EUR	0	11313,22	11313,22
IROP	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	28,5	22	13,10
PRV	94302	Celková délka lesních cest	km	0	0	0
PRV	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	ks	0	2	0,5 - závazek
OP Z	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	organizace	0	1	1 - závazek
OP Z	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	osoby	0	5	5
OP Z	62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	0	4	0
OP Z	62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	0	4	19

7



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

OP Z	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	0	5	7
OP Z	62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	0	8	16
OP Z	63100	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	0	1	0
OP Z	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	0	3	0
PRV	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	ks	0	22	15 (20 závazek)
PRV	93102	Počet podpořených kooperačních činností	ks	0	0	0
PRV	92702	Počet podpořených operací (akcí)	ks	0	14	11 (15 – závazek)
PRV	93001	Celková plocha	ha	0	139,4	139,4
Vlastní		Počet turistických balíčků	ks	0	3	1
IROP	10000	Počet podniků pobírajících podporu	podnik	0	3	1
IROP	10102	Počet podniků pobírajících granty	podnik	0	3	1





IROP	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	0	6,75	2,25
IROP	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	0	2	0
IROP	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	0	4909,09	103053,44
IROP	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	0	2,03	1,25
OP Z	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	0	1	1
OP Z	60000	Celkový počet účastníků	osoby	0	24	32
IROP	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	5,4	5,0	6,8
IROP	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	77,3	90,5	82,1
IROP	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	0	13	3
IROP	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení.	Osoby	0	150	180



## SCLLD 21-27

### Přehled programových rámců/akčních plánů:

- OPZ+ schválen dne 21.3.2023 na 13 705 991,04 Kč (za podmínky realizace dvou projektů).
- OP TAK schválen dne 18.5.2023 na 2 100 000 Kč (jedná se o 50 % celkové alokace), částka změnou SCLLD navýšena na 2 240 000 Kč
- IROP 21-27 schválen 20.7.2023 na 32 803 286 Kč (jedná se o 70 % celkové alokace).
- SZP schválen 29.5.2024 na 15 207 600 Kč (jedná se o 100 % celkové alokace).

Projekt Komunita pro komunitu z OPZ+ je realizován od 1.2.2023. Dosud byla předložena dvě vyúčtování. Rychlost čerpání je nižší ale stále v normě. Plnění indikátorů je v normě mimo indikátoru 670102 Využívání podpořených služeb. Doporučujeme se na plnění tohoto indikátoru zaměřit.

V OP TAK nebyla vyhlášena výzva, probíhá její příprava. Doporučujeme vyhlásit výzvu, co nejdříve to bude možné na plnou alokaci kvůli plnění milníku.

V IROP 21-27 byly v roce 2023 vyhlášeny 3 výzvy na celkovou alokaci 28 303 286 Kč, tj. 86,3 % dosud přidělené alokace. Do výzev bylo přijato 7 projektů ve výši alokace (dotace) 22 218 752,19 Kč, tj. 67,7 % dosud přidělené alokace. Projekty jsou k 5/2024 stále v hodnocení na MAS a délka jejich plánované realizace překračuje sledovaný milník. Jakmile budou projekty vybrány, doporučujeme s žadatelem komunikovat nad možností rychlejší realizace projektů z důvodu plnění milníku. K plnění či závazkování indikátorů zatím nedochází.

10

U SZP došlo ze strany MZe k značnému zpoždění z důvodu dlouhého schvalování standardizace MAS kvůli nedostatečným kapacitám na MMR. Zatím nebyla vyhlášena výzva. Kvůli plnění milníku doporučujeme vyhlásit výzvu ještě v roce 2024, pokud to bude kvůli administrativním kapacitám MAS možné.

Přehled sledovaného finančního plánu a indikátorů se nachází ve Zprávě o plnění ISg.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Nepovinné interní indikátory plněné i mimo programové rámce:

<i>Strategický cíl</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Výchozí hodnota (31. 5. 2021)</i>	<i>Cílová hodnota (31. 12. 2027)</i>	<i>Skutečný stav (05/2024)</i>
<b>Strategický cíl 1: Atraktivní region pro život</b> – Region s kvalitními životními podmínkami a bohatým společenským životem	Podpořené projekty obcí	<i>Počet projektů</i>	0	15	0
	Podpořené projekty nestátních neziskových organizací	<i>Počet projektů</i>	0	3	0
	Podpořené či realizované projekty zlepšující životní podmínky v regionu	<i>Počet projektů</i>	0	15	1 (realizace poradenství NZÚL)
	Podpořené spolupráce	<i>Počet spoluprací</i>	0	3	0
<b>Strategický cíl 2: Atraktivní region pro hospodaření</b> – Region využívající svůj potenciál pro udržitelný hospodářský růst	Podpořené projekty podniků a podnikatelů	<i>Počet projektů</i>	0	10	0
	Podpoření zaměstnanci	<i>Počet zaměstnanců</i>	0	8	3 (zaměstnanci KONEP v rámci projektu Komunita pro komunitu)

11



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>Strategický cíl 3:</b> <b>Atraktivní region</b> <b>pro vzdělávání –</b> <b>Region podporující</b> <b>vzdělávání pro</b> <b>plnohodnotný život</b> <b>při zachování</b> <b>přírodních a</b> <b>kulturních hodnot</b>	Počet podpořených či realizovaných aktivit podporujících cestovní ruch	<i>Počet aktivit</i>	0	3	0
	Počet podpořených škol	<i>Počet škol</i>	0	4	0
	Počet podpořených projektů dalších subjektů ve vzdělávání a osvětě	<i>Počet projektů</i>	0	2	0

Pokud je v indikátoru uvedeno, že se jedná o:

- „podpořené projekty“, jsou tím myšleny projekty podpořené MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,
- „podpořené či realizované projekty“, jsou tím myšleny projekty podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,
- „podpořené spolupráce“, jsou tím myšleny nové i stávající spolupráce podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,
- „podpoření zaměstnanci“, jsou tím myšleny takové aktivity a podpořené či realizované projekty MAS Region Kunětické hory, které mají přímý přínos pro zaměstnance žijící či pracující v regionu, přičemž každý podpořený zaměstnanec se započítává pouze jednou,
- „podpořené či realizované aktivity“, jsou tím myšleny aktivity či projekty podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,
- „podpořené školy“, jsou tím myšleny projekty a aktivity podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027, přičemž každá podpořená škola se započítává pouze jednou.

12



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR
